


Anliegerinfo Nr. 1

Ausbau der Deisinger Straße in Pappenheim



Mit dem Ausbau der bestehenden Fahrbahn wurde begonnen.

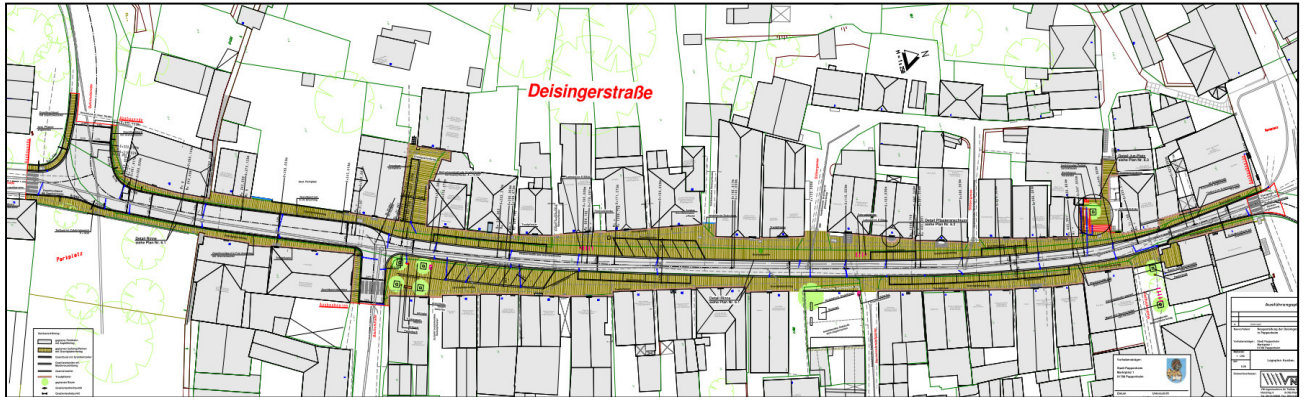

Derzeit sind die Bauarbeiten auf den Bereich Stadtvogteigasse bis Stöbergasse beschränkt. Grund dafür sind zwei 20 KV Kabelstränge. Der eine Kabelstrang kommt vom Marktplatz und führt in die Stöbergasse und ist derzeit aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Die Stadt Pappenheim wird momentan über den zweiten 20 KV Strang, der von Westen in die Stöbergasse führt, versorgt.

Erst wenn die Überdeckung des östlichen Stranges hergestellt wurde, kann im westlichen Teil die 20 KV Leitung abgeschaltet werden.

Der Ausbau begrenzt sich auf den vorgenannten Bereich, da erst nachdem das Abbruchgut des Lämmermannhauses beprobt, gebrochen und abgefahren wurde, die Straßenbauarbeiten in diesem Bereich beginnen können. Derzeit wartet die mit dem Abbruch beauftragte Firma auf das Ergebnis der Beprobung.

Die Arbeiten werden auch noch in der nächsten Woche im vorgenannten Bereich mit dem Ausbau der bestehenden Kreisstraße und der Herstellung des Frostkoffers für die geplante Straße fortgeführt.

**Mit freundlichen Grüßen
Ihre Bauleitung vom Ingenieurbüro VNI**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' followed by a smaller, more complex mark.

Versand über E-Mail Verteiler
Versand an Stadtrat
