


Anliegerinfo Nr. 10

vom 01.08.2018

Ausbau der Deisinger Straße in Pappenheim

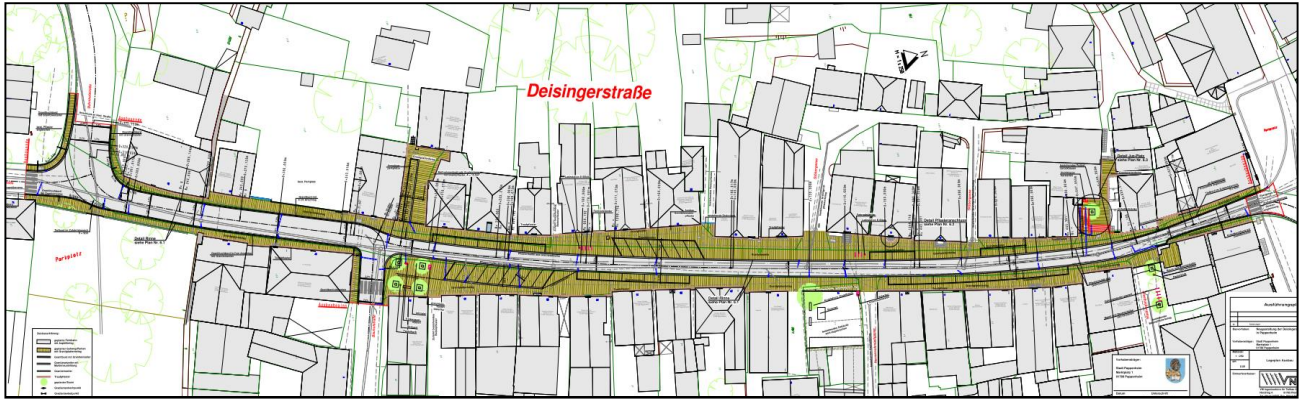

Die Pflasterverlegearbeiten sind im 1. Bauabschnitt bis auf den Bereich JuZ- Platz abgeschlossen.



Bis zum Wochenende werden die Abdeckfolien entfernt. Anschließend können alle Pflasterbereiche begangen, jedoch vorerst noch nicht befahren werden.

Im Bereich Gasthof Sonne bis Bauhofstraße wurde die Asphalttragschicht der Fahrbahn eingebaut. Bis zum Wochenende werden in diesem Bereich Kabelgräben erstellt und Leerrohre für Lichtwellenleiter zu den Anwesen geführt.



**In der KW 32 und KW 33 hat die Fa. Rossaro Betriebsurlaub.
In dieser Zeit stehen für den fußläufigen Verkehr alle Pflasterflächen und die provisorischen Gehwege zwischen dem Gasthof Sonne und der Bauhofstraße zur Verfügung. Lediglich im Bereich Hs. Nr.21 besteht aufgrund einer Vielzahl von Kabeln und Leitungen keine Möglichkeit zur Herstellung eines Gehweges. Der Anlieferverkehr erfolgt wie bisher.
Bereits in der KW 33 werden in der Stöbergasse die Arbeiten für die Stromversorgung durchgeführt.
Ab der KW 34 werden Kabel und Leitungen im 2. Bauabschnitt (Gasthaus Sonne bis Bauhofstraße) hergestellt und die Erdarbeiten für die Nebenflächen durchgeführt.**

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Bauleitung vom Ingenieurbüro VNI

Versand über E-Mail Verteiler
