


Anliegerinfo Nr. 2

Ausbau der Deisinger Straße in Pappenheim

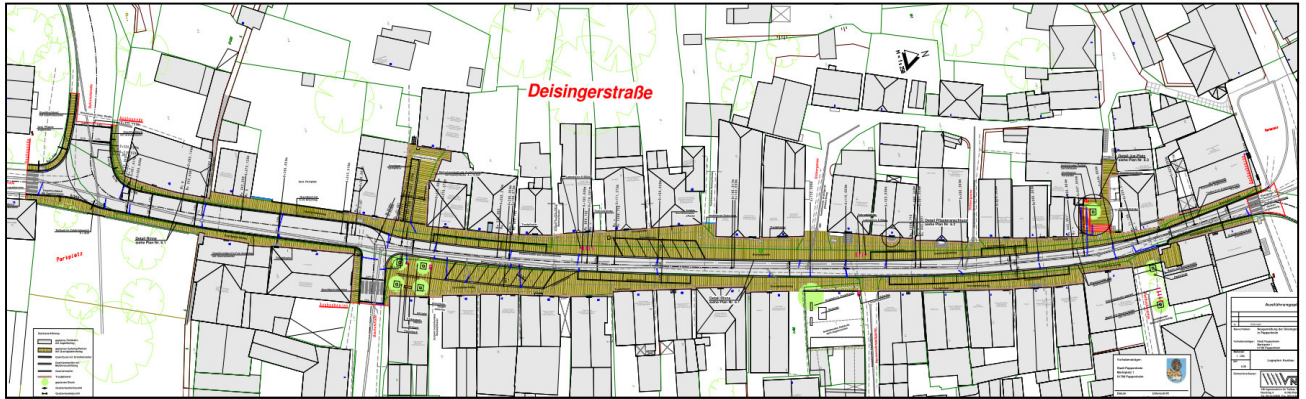

Die Abbrucharbeiten am Lämmermannhaus sind abgeschlossen. Das Brechen des Abbruchgutes am Mittwoch und Donnerstag war nur mit geringen Lärmemissionen verbunden und durch vorbildliche Bewässerung nahezu ohne Staubeentwicklung.

Die frei gewordene Fläche lässt schon jetzt erkennen, dass der hier entstehende Platz eine hohe Aufenthaltsqualität haben wird. In den nächsten Tagen wird auf dem Platz eine Wendemöglichkeit für Lieferfahrzeuge hergestellt und die Baustelleneinrichtung umgesetzt.



Die Straßenbauarbeiten wurden im Bereich der Engstelle Rathaus fortgeführt. In diesem Bereich müssen noch, in Abstimmung mit den Stadtwerken und dem IB Bamberger, Leerrohre für Strom und Straßenbeleuchtung hergestellt werden.



Ende der nächsten Woche werden die Pflasterarbeiten für den Zweizeiler der Fahrbahnrandbegrenzung im Bereich Rathaus - Stöbergasse begonnen.

Die Erdarbeiten werden ab der übernächsten Woche in Richtung Westen fortgeführt.

**Mit freundlichen Grüßen
Ihre Bauleitung vom Ingenieurbüro VNI**
