



Anliegerinfo Nr. 20 vom 05.05.2019

Ausbau der Deisinger Straße in Pappenheim

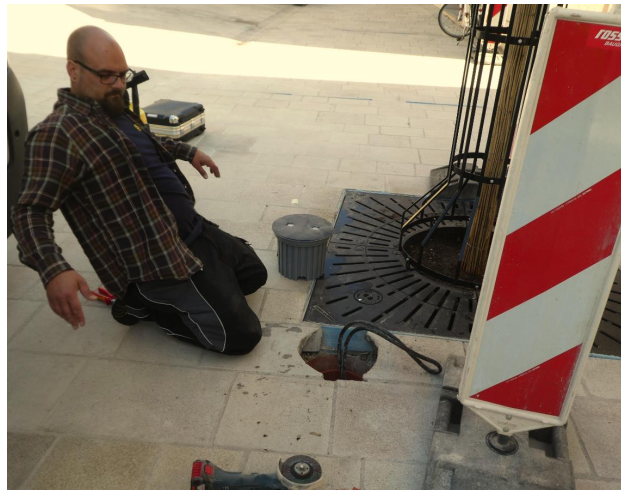

In der vergangenen Woche wurde mit der Montage der Bodenleuchten begonnen

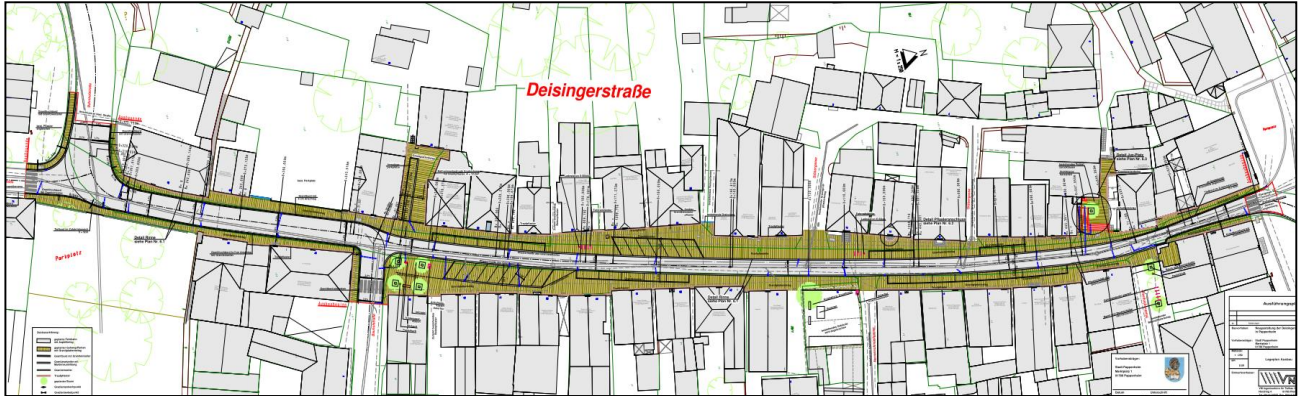

Die Gehwege im Bereich Bauhofstraße bis zur katholischen Kirche wurden zum Teil schon mit dem Plattenbelag hergestellt



Die Zufahrt zum Parkplatz ist wieder benutzbar



Die Fahrbahnränder der Bahnhof- und Schützenstraße wurden gepflastert

Als nächster Schritt stehen die Asphaltarbeiten an.

Am Mittwoch, den 08.05.2019 werden Fräsarbeiten in den Anschlussbereichen und längs der Deisinger Straße ausgeführt. Hierbei kann es zu kurzen Behinderungen kommen, die aus unserer Sicht für die Anlieger und Anwohner immer noch besser als eine Vollsperrung sind.

Am Donnerstag, den 09.05.2019 wird im Bereich der katholischen Kirche die Asphalttragschicht eingebaut und anschließend in der Deisinger Straße vom Rathaus her der Einbau der Asphaltdeckschicht begonnen. Soweit alles klappt wird die Deckschicht bis zur Bauhofstraße hergestellt.

Ab Donnerstag gilt eine Vollsperrung für den Gesamtbereich der Deisinger Straße. Für die Schützenstraße werden wir von der Bahnhofstraße einen Fahrstreifen offenhalten. Jedoch kann es auch hier zu Beeinträchtigungen kommen. Wir bitten deshalb alle die nicht zwingend fahren müssen, diesen Bereich zu meiden.

Am Freitag, den 13.05.2019 gilt, aufgrund des Einbau der Asphaltdeckschicht, für den gesamten Ausbaubereich eine Vollsperrung. Es ist auch keine Zufahrt zur Schützenstraße möglich. Für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge besteht eine Notzufahrt über den Vorplatz der katholischen Kirche.

Der fußläufige Verkehr ist in der Gesamtzeit gewährleistet.

Ab Montag, den 13.05.2019 erfolgt der Verkehr wieder mit Ampelregelung wie in den letzten Wochen. Die Zufahrt zur Schützenstraße von der Bahnhofstraße wird, soweit die Asphaltdeckschicht ausgekühlt ist, bereits am Samstag, den 11.05.2019 geöffnet.

Wir bitten alle Firmen Anlieferungen mit großen Lkw umzuleiten, damit nicht wie in der vergangenen Woche stundenlange Verzögerungen durch Lkw, die die Straße verstopft haben, entstehen.

In den nächsten Wochen werden die Restarbeiten zur Herstellung der Pflasterbeläge in den Gehwegen, am Juz-Platz und in den Nebenflächen hergestellt, die Möblierung eingebaut, der zwischengelagerte Aushub abgefahren sowie Restarbeiten vorgenommen. Soweit witterungsabhängig auch noch die Dehnungsfugen hergestellt werden können, steht der Einweihungsfeier der neuen Deisinger Straße nichts mehr im Weg.

Ihre Bauleitung vom Ingenieurbüro VNI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.

Versand über E-Mail Verteiler
