


Anliegerinfo Nr. 4 vom 11.05.2018

Ausbau der Deisinger Straße in Pappenheim



Trotz der kurzen Woche hat sich auf der Baustelle etliches getan.
Die Pflasterarbeiten zur Herstellung des 2 Zeilers aus Granitgroßpflaster wurden fortgeführt

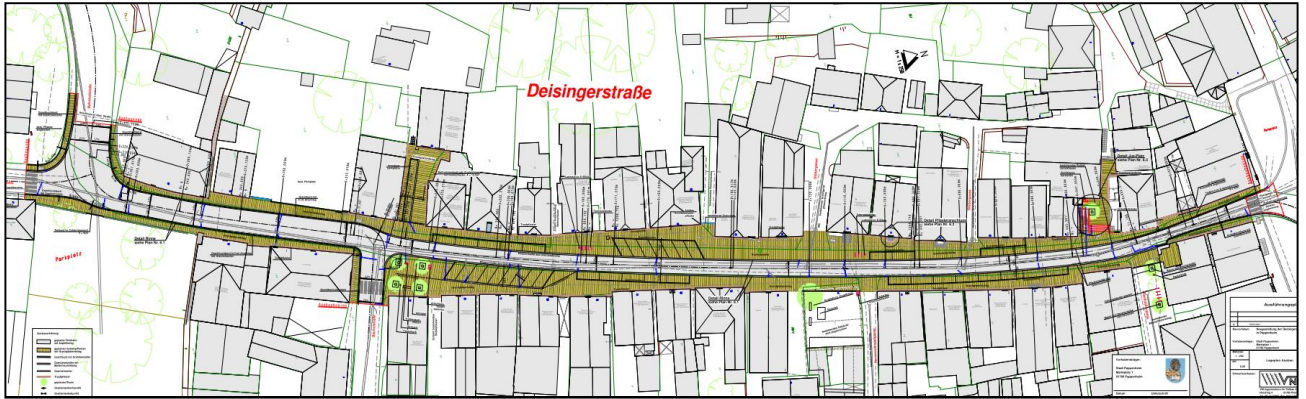

**Im Bereich der Engstelle wurde die erste Lage der Frostschutzschicht eingebaut.
Der Zugang zum Notar erfolgt über einen seitlichen Schotterstreifen.**



Die Erdarbeiten für die Fahrbahn werden ab Montag, den 14.05. 2018 nach Westen bis zum Gasthaus zur Sonne fortgeführt. Lieferverkehr ist dann von Süden nur noch bis zur Volksbank möglich.

Die Pflasterarbeiten zur Herstellung des Granitbordes im Bereich der Engstelle werden ab Montag begonnen. Der Granitzweizeiler wird bis ca. 0 + 140 hergestellt.

Wir haben uns mit der Fa. Rossaro dahingehend abgestimmt, dass am Ende der kommenden Woche voraussichtlich die Asphalttragschicht in der ersten Hälfte eingebaut wird. Dies führt zwar zu zusätzlichen Kosten bietet aber für die Anlieger große Vorteile.

Voraussichtlich werden wir im Bereich der hergestellten Asphalttragschicht gleich mit der Herstellung von Kabeln und Leitungen fortfahren, damit möglichst bald die Pflasterarbeiten in den Seitenflächen beginnen können.

**Mit freundlichen Grüßen
Ihre Bauleitung vom Ingenieurbüro VNI**

Versand über E-Mail Verteiler
