


Anliegerinfo Nr. 6

Ausbau der Bauhofstraße in Pappenheim

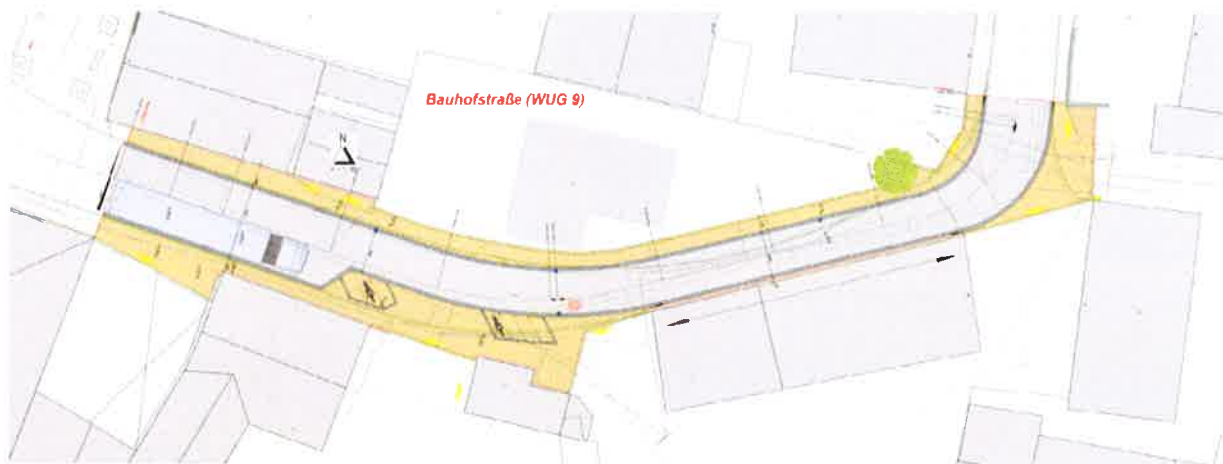

Bauhofstraße

Ausbau Bauhofstraße

Bis Ende dieser Woche ist der Ausbau des bestehenden Straßenunterbaus abgeschlossen.

Zeitgleich wurde auch die erste Lage der Frostschutzschicht hergestellt.





Gehweg links



Ab der kommenden Woche erfolgen der Ausbau des linksseitigen Gehweges und die Herstellung der Kabelgräben für Leerrohre und Beleuchtung.

Ab der 47. Kalenderwoche erfolgt die Verlegung der Leerrohre und Kabel für Telekommunikation, Strom Stadtwerke und Mikrokabel.

Ab Ende November ist die Herstellung der Fahrbahnträger als Vorarbeit für den Einbau der Asphalttragschicht geplant.

Zufahrtsmöglichkeiten für erforderliche Anlieferungen sind wie bisher mit dem Polier der Firma Rossaro rechtzeitig, nach Möglichkeit 1 bis 2 Werktage vorher, vor Ort abzustimmen.

Mit freundlichen Grüßen



Ihre Bauleitung vom Ingenieurbüro VNI

05.11.2020

Versand über E-Mail Verteiler
