


Anliegerinfo Nr. 8 vom 22.06.2018

Ausbau der Deisinger Straße in Pappenheim



**Im östlichen Bereich wurden die Gehwegplatten verlegt.
Im Bereich der Engstelle Europäisches Haus beidseitig im weiteren Verlauf an der Westseite.**

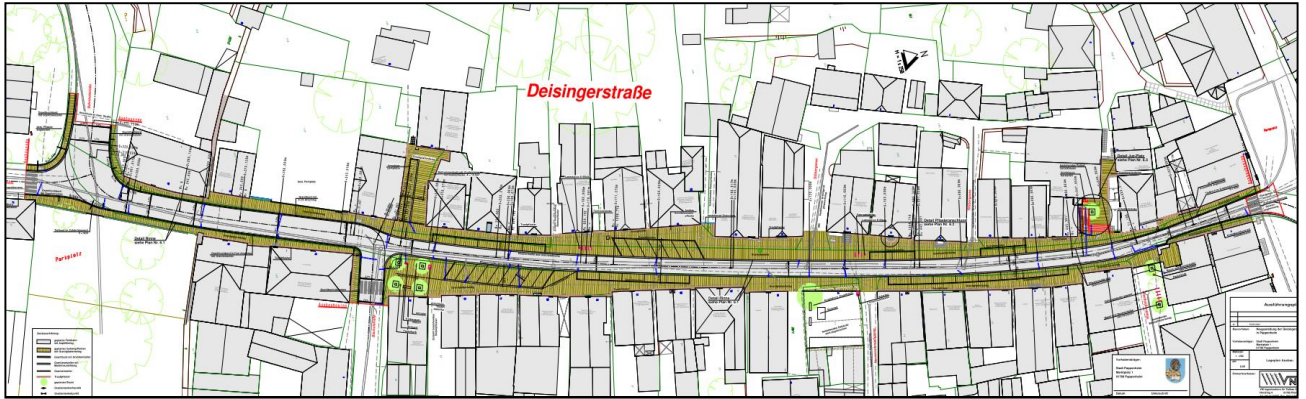



Der Zugang zu den Anwesen erfolgt derzeit über einen Textiltr Teppich auf dem Drainbeton.



Anfang nächster Woche wird das Traufpflaster im östlichen Bereich hergestellt und seitens der Telekom werden Spleissarbeiten durchgeführt. Bis zum nächsten Wochenende sollte in diesem Bereich der Drainbeton eingebaut sein.

Ende nächster Woche werden die Erdarbeiten zwischen dem Gasthaus Sonne und dem Friseur Edel begonnen.



Bis zum Volksfest (20. - 23. 07 2018) werden die auf dem Festplatz zwischengelagerten Erdhaufen abgefahren. Voraussichtlich werden wir zu diesem Zeitpunkt im Bereich zwischen dem Friseur Edel und der Bauhofstraße tätig sein.

Am verkaufsoffenen Sonntag dürfte der nördliche Bereich ungehindert begehrbar sein. Der südliche Abschnitt ist voraussichtlich nur über Provisorien erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Bauleitung vom Ingenieurbüro VNI

Versand über E-Mail Verteiler
