


Anliegerinfo Nr. 13 vom 07.11.2018

Ausbau der Deisinger Straße in Pappenheim



Die Pflasterarbeiten nähern sich der Bauhofstraße. Noch verbirgt der Zementschleier die Schönheit der Granitplatten

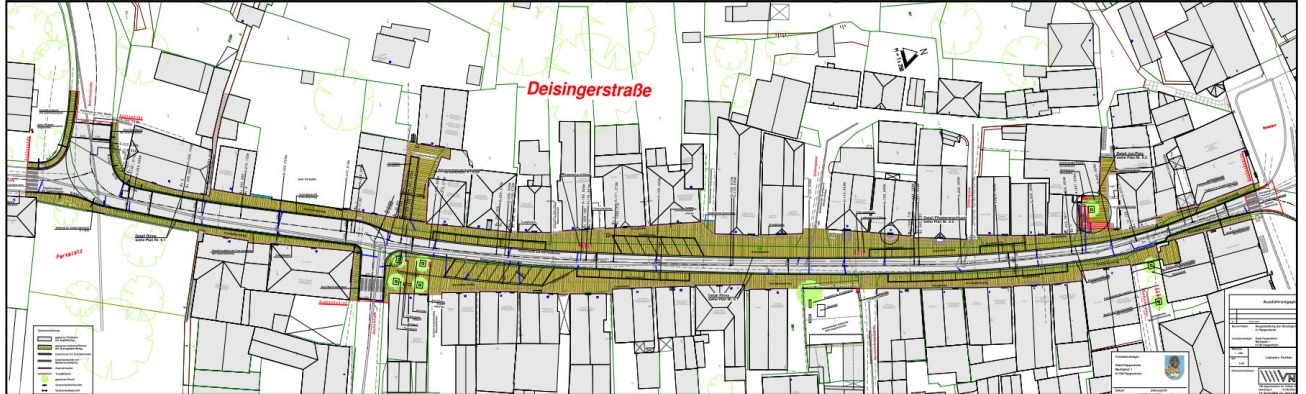

Die Autofahrer erobern jeden frei werdenden Quadratmeter trotz Sperrung.

Die Hauptwasserleitung wurde in den vergangenen Tagen erneuert. Derzeit warten wir auf das Ergebnis der Wasserbeprobung, dann können die Hausanschlüsse hergestellt werden.



Parallel zu den Wasserleitungsarbeiten werden die Erdarbeiten für den Gehweg und den westlichen Fahrbahnrand ausgeführt.



Nächste Woche werden im westlichen Gehweg Leerrohre für Lichtwellenleiter, Strom- und Beleuchtungskabel verlegt. In der übernächsten Woche beginnen die Pflasterarbeiten für den westlichen Fahrbahnrand. Die Erdarbeiten verlagern sich dann vor die Filiale der Metzgerei Würlein damit die Baumscheiben gesetzt werden können. Anschließend beginnen die Erdarbeiten im Bereich Schindler – katholische Kirche am östlichen Fahrbahnrand.

**Mit freundlichen Grüßen
Ihre Bauleitung vom Ingenieurbüro VNI**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.

Versand über E-Mail Verteiler
