


Anliegerinfo Nr. 15

vom 19.12.2018



Ausbau der Deisinger Straße in Pappenheim

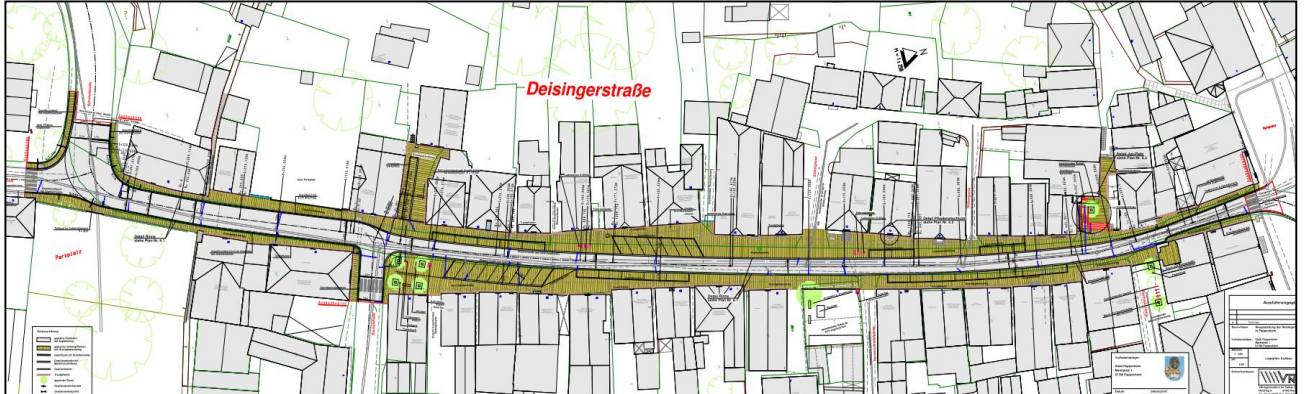

Vor der Metzgereifiliale Würlein musste ein 20 kV Kabel umverlegt werden, da es sich genau unter einer der vier geplanten Baumscheiben befand. Dank der schnellen Unterstützung durch die Stadtwerke hatten wir dadurch nur wenige Tage Verzögerung zu verzeichnen.



Die Verlegung der Leerrohre für Lichtwellenleiter FTTH ist abgeschlossen. Zu jedem Anwesen in der Deisinger Straße wurde ein Mikrokabelrohr verlegt, in das später ein Glasfaserbündel eingeblasen werden kann. 3 zusätzliche Kabelbündel mit jeweils 12 bzw. 24 Mikrokabelrohren enden am Ausbau zur Bauhofstraße damit auch in der Graf-Carl-Straße und dem Marktplatz eine Fortführung möglich ist. Je ein Kabelbündel wurde in der Stöbergasse und im westlichen Gehweg der Schützenstraße hergestellt.

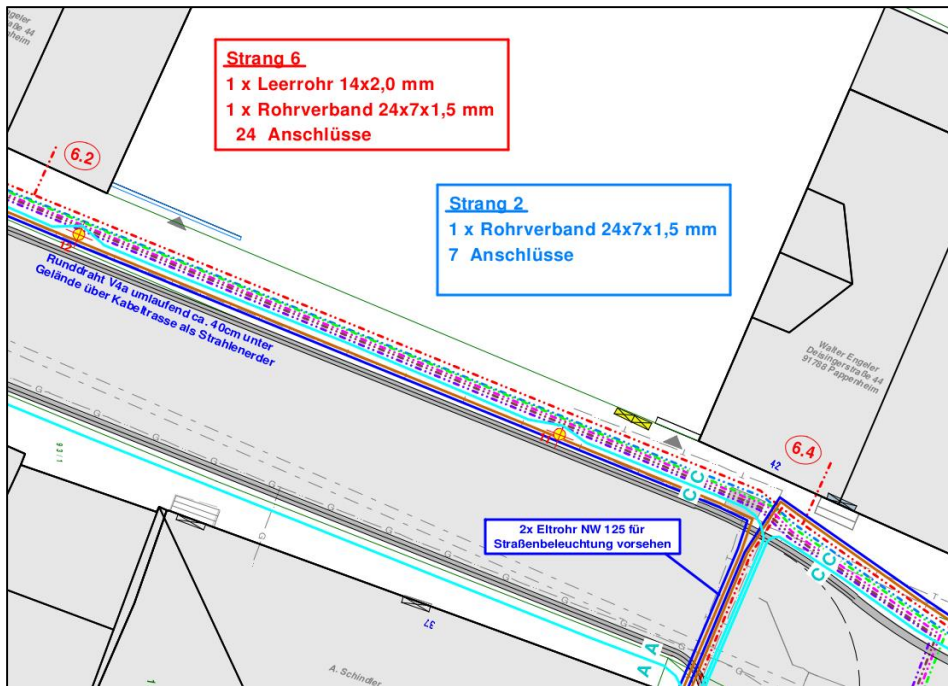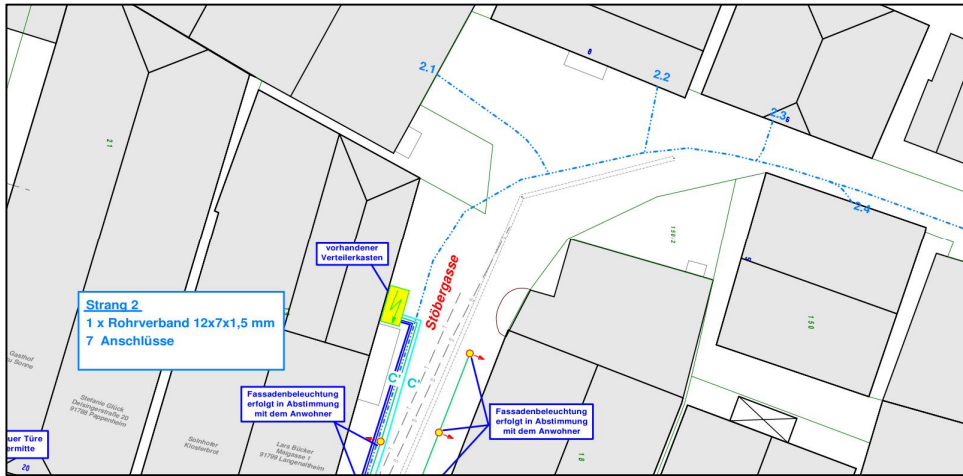

Ausschnitte aus den Verlegeplänen für Lichtwellenleiter



Durch den Einsatz des Bürgermeisters und der Verwaltung ist seit Dienstag, den 11.12.2018 der Bereich zwischen dem Marktplatz und der Herrenschmiedgasse für den Verkehr freigegeben. Die Geschäfte in der Deisinger Straße sind seither wieder mit dem Pkw erreichbar.



Gestern wurde die Asphalttragschicht zwischen der Bauhofstraße und dem Ausbauende in der Bahnhofstraße eingebaut. Der ostseitige Gehweg wurde verkehrs- und wintersicher mit einer dünnen Asphaltdeckschicht versiegelt. Der gegenüberliegende Gehweg bleibt über die Winterpause gesperrt. Lediglich der Zugang und die Zufahrt Engeler sind benutzbar.



Auch die Ecke Bauhofstraße / Deisinger Straße wurde mit einem provisorischen Gehwegbelag wintersicher hergestellt.



Heute und morgen wird noch der Bereich vor der Metzgereifiliale Wörlein und der Zufahrt Dengler mit Schotter verfüllt.

Voraussichtlich am Donnerstag wird die überörtliche Umleitungsbeschilderung durch die Fa. Rossaro entfernt.

Vom Bauhof wird bis dorthin die für den innerörtlichen Verkehr erforderliche Beschilderung hergestellt. Allen damit befassten Mitarbeitern der Stadt sei an dieser Stelle ein Dankeschön für die gute Zusammenarbeit ausgesprochen.

Ab Donnerstag 20. Dezember werden die Bauarbeiten eingestellt. Die Altstadt von Pappenheim ist dann über die Winterpause wieder uneingeschränkt erreichbar.

Witterungsabhängig werden die Arbeiten ca. ab 15. Januar 2019 fortgesetzt. Ob die Arbeiten mit der Herstellung der Fahrbahn im Anschlussbereich der Schützenstraße und vor der kath. Kirche im Bereich Anschluss Bahnhofstraße fortgesetzt werden, oder ob wir zuerst den Bereich JUZ Platz oder den Platz zwischen Betten Gampl und dem Anwesen Walter Engeler in Angriff nehmen, muss noch entsprechend der Witterungsverhältnisse bzw. der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte abgestimmt werden. Wir werden so früh wie möglich informieren.

Im nächsten Jahr werden voraussichtlich noch 2 Vollsperrungen im Bereich Bauhofstraße Æ Bahnhofstraße zum Einbau der Granitpflasterbeläge in den Gehwegen und zur Herstellung der Asphaltdeckschicht erforderlich sein.

Den Gewerbetreibenden in der Deisinger Straße wünschen wir gute Geschäfte.

Ihnen allen wünschen wir ein Frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das Neue Jahr

Ihre Bauleitung vom Ingenieurbüro VNI



Versand über E-Mail Verteiler
