


Anliegerinfo Nr. 2

Ausbau der Bauhofstraße in Pappenheim und Sanierung der Abwasserhausanschlüsse in der Graf-Carl-Straße



Bauhofstraße

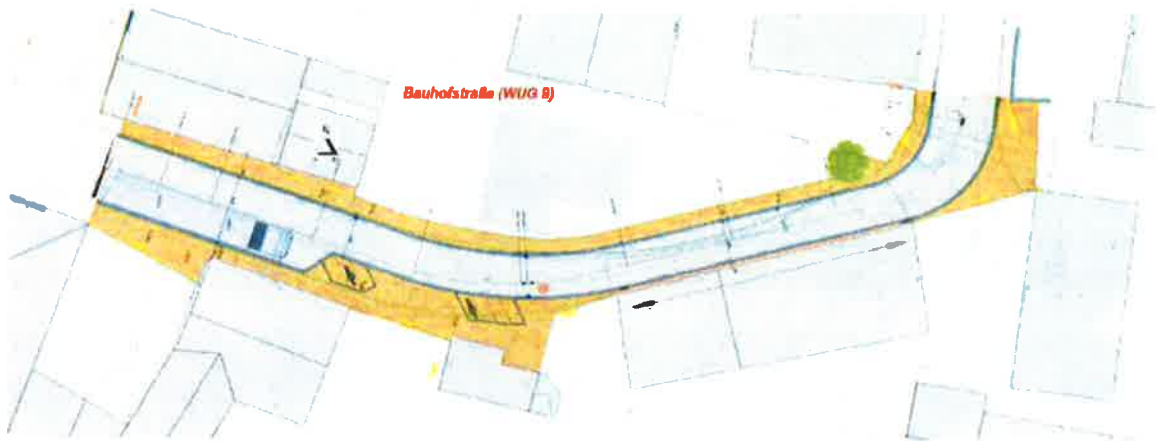

Graf-Carl-Straße

Die Kanalhausanschlüsse zwischen der Herrenschmiedgasse und der Stadtvogteigasse wurden bereits saniert.

Bis Ende der 42. KW ist die Instandsetzung und Erneuerung der Hausanschlüsse im Restabschnitt der Graf-Carl-Straße bis Bauhofstraße abgeschlossen.



Detail Herstellung neuer Hausanschluss an Hauptkanal

Im Anschluss an die Kanalsanierung in der Graf-Karl-Straße erfolgt der Ausbau der Bauhofstraße.

Für den 15.10.2020 sind die Fräsarbeiten für den Straßenaufbruch in der Bauhofstraße geplant. Ab diesem Datum erfolgt die Erneuerung der Hausanschlüsse und der Ausbau des Straßenkoffers. Mit Beginn dieser Arbeiten ist nur noch ein bedingtes Zufahren über die Bauhofstraße möglich. Eine Zufahrt zur Graf-Karl-Str. kann dann nur noch über die Herrenschmiedgasse (Einbahnstraßenregelung) erfolgen. Zufahrtsmöglichkeiten für erforderliche Anlieferungen sind mit dem Polier der Firma Rossaro rechtzeitig vor Ort abzustimmen.

Zeitgleich zu den Kanalsanierungsarbeiten in der Graf-Carl-Straße erfolgen durch den Landkreis und den Bauhof der Stadt Pappenheim Sanierungsarbeiten an den Granitzweizeilern und Borden.

Diese Arbeiten sollen bis Ende der KW 44 abgeschlossen sein.



Sanierung Borde und Rinnen

Ebenfalls in diesem Zeitraum erfolgt im Bereich der Querungen und Hausanschlüsse der Einbau der Asphalttragschicht im Fahrbahnbereich Graf-Karl-Straße durch die Fa. Rossaro.

Der Einbau der bituminösen Tragschicht erfolgt bis auf Niveau der bestehenden Fahrbahnoberkante.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Bauleitung vom Ingenieurbüro VNI

Versand über E-Mail Verteiler
